

WIR.062.1.2026

DRUK Nr 428

Rada Miejska Łomży

Dotyczy: Sprawozdanie/Raport z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży za 2025 r.

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 Porozumienia Międzygminnego z dnia 25 marca 2026 r. zmieniającego Porozumienie Międzygminne zawarte w dniu 01 marca 2024r. w sprawie kontynuacji współpracy w ramach związku ZIT oraz określenia zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży, służących realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz w związku z zapisami zawartymi w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży pkt 7.2.1. Monitorowanie procesu wdrażania strategii, w załączeniu przedstawiam Wysokiej Radzie Sprawozdanie/Raport z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży za 2025 r.

Z poważaniem

Z up. Prezydenta Miasta
Piotr Serdyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Załącznik:

Sprawozdanie/Raport z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży za 2025 r.



Sprawozdanie/Raport
z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Miasta Łomży

za 2025 r.



Czerwiec 2026 r.

Spis treści

1. Podstawa formalno-prawna	3
2. System zarządzania wdrażaniem Strategii ZIT MOF Miasta Łomży.....	3
3. Główne założenia Strategii ZIT MOF Miasta Łomży	6
4. Wdrażanie Strategii ZIT MOF Miasta Łomży	9
4.1. Porozumienie w sprawie realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	9
4.2. Opis stanu realizacji zaplanowanych działań w ramach Strategii ZIT oraz źródła finansowania.	10
4.3. Problemy i propozycje działań usprawniających wdrażanie alokacji ZIT	20
4.4. Stopień realizacji wskaźników Strategii ZIT MOF Miasta Łomży	21
4.5. Partycypacja społeczna	26
5. Podsumowanie	26
Spis rysunków.....	27
Spis tabel	27

1. Podstawa formalno-prawna

„Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży” została przyjęta Uchwałą nr 691/LXXVIII/23 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 listopada 2023 r. oraz Zarządzeniem nr 319/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 29 listopada 2023 r.

„Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży” jest strategią rozwoju pełniącą funkcję strategii ZIT. Została opracowana dla Partnerstwa: Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Łomży, w skład którego wchodzi Miasto Łomża, Gmina Łomża, Gmina Nowogród, Gmina Piątnica tworzące związek ZIT.

Partnerstwo funkcjonuje jako związek ZIT w formie porozumienia międzygminnego na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W skład związku ZIT wchodzi Miasto Łomża, Gmina Łomża, Gmina Nowogród, Gmina Piątnica na mocy porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 23 grudnia 2022 r. (Dz. U. Województwa Podlaskiego z 2 stycznia 2023 r. poz. 15), zmienionego Aneksami nr 1 (Dz. U. Województwa Podlaskiego z 12 lipca 2023 r. poz. 3859) oraz Aneksami nr 2 (Dz. U. Województwa Podlaskiego z 29 grudnia 2023 r. poz. 6952). Porozumienie zostało zawarte na okres przygotowania dokumentów strategicznych oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do przyjęcia Strategii ZIT, zgodnie z dokumentami programowymi określającymi wydatkowanie środków UE na lata 2021-2027. Na potrzeby wdrażania Strategii ZIT Miasta Łomży zostało zawarte kolejne porozumienie tj. porozumienie międzygminne z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie kontynuacji współpracy w ramach związku ZIT oraz określenia zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży, służących realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Dz. U. Województwa Podlaskiego z dnia 14 marca 2024 r. poz. 1500). W dniu 25.03.2026 r. zostało zawarte Porozumienie Międzygminne zmieniające Porozumienie Międzygminne z dnia 01.03.2024 r. (Dz. U. Województwa Podlaskiego z dnia 14 kwietnia 2026 r. poz. 1665). Liderem Porozumienia jest Miasto Łomża.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży przedstawia cele strategiczne, kierunki działań oraz przedsięwzięcia, za pomocą których są realizowane. Wskazane w strategii przedsięwzięcia grupują większą liczbę projektów realizowanych przez wszystkie gminy wchodzące w skład Partnerstwa.

Strategia zawiera m.in. syntezę diagnozy, cele, do których Partnerstwo dąży oraz odpowiadające im kierunki działań, wskaźniki, listę projektów ZIT wraz z informacją o ich wyborze, źródła finansowania i opis systemu wdrażania.


Strategia obowiązuje do 2030 roku, co wynika z ram czasowych programowania środków unijnych na lata 2021–2027 (z możliwością ich wydatkowania do końca 2029 roku). Obowiązek sporządzania raportów o stanie realizacji Strategii ZIT wynika bezpośrednio z zapisów zawartych w dokumencie strategicznym.

2. System zarządzania wdrażaniem Strategii ZIT MOF Miasta Łomży

System realizacji Strategii ZIT tworzą realizatorzy wewnętrzni oraz zewnętrzni.

Realizatorami wewnętrznymi są: Lider Porozumienia, Komitet Sterujący związku ZIT, Grupa Robocza, Zespół doradczy partnerów społeczno-gospodarczych.

Realizatorzy zewnętrzni Strategii to wykonawcy oraz partnerzy realizacyjni.

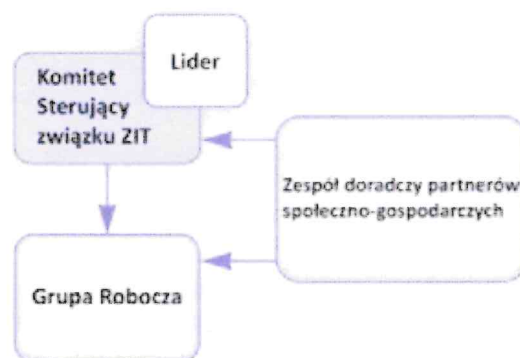

Rysunek 1 Struktura zarządzania wdrażaniem Strategii ZIT

W skład Komitetu Sterującego związku ZIT wchodzi:

- Prezydent Miasta Łomży
- Wójt Gminy Łomża
- Burmistrz Nowogrodu
- Wójt Gminy Piątnica

Do zadań Komitetu Sterującego należy:

- nadzór nad wdrażaniem Strategii ZIT (ze zmianami), współpraca przy prowadzeniu monitoringu i ewaluacji Strategii ZIT (ze zmianami), inicjowanie jej ewentualnych modyfikacji i przyjmowanie sprawozdań z realizacji Strategii ZIT (ze zmianami);
- opiniowanie lub zatwierdzanie innych dokumentów wymaganych w procesie przygotowania dokumentów niezbędnych do realizacji ZIT, jak również wdrażania i realizacji projektów w ramach związku ZIT;
- zatwierdzanie projektu aktualizacji Strategii ZIT oraz jej zmian celem przedstawienia rekomendacji w zakresie ich przyjęcia właściwym organom.

Lider Porozumienia – Miasto Łomża.

Do zadań Lidera należy:

- koordynacja przygotowania dokumentów niezbędnych do realizacji ZIT,
- koordynacja aktualizacji Strategii ZIT oraz opracowania i realizacji innych dokumentów niezbędnych do opracowania aktualizacji Strategii ZIT;
- wdrażanie Strategii ZIT (ze zmianami), zgodnie z dokumentami programowymi określającymi wydatkowanie środków UE na lata 2021-2027, tj. koordynowanie przygotowania działań i projektów, inicjowanie modyfikacji Strategii ZIT, przyjmowanie sprawozdań z realizacji Strategii ZIT (ze zmianami);
- reprezentowanie związku ZIT przed podmiotami i osobami trzecimi.

W skład Grupy Roboczej wchodzi:

- Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Urząd Miejski w Łomży, Koordynator Grupy Roboczej;
- Starszy Inspektor Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Urząd Miejski w Łomży, Zastępca Koordynatora Grupy Roboczej;
- Inspektor ds. programów pomocowych i pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, Urząd Miejski w Nowogrodzie Członek Grupy Roboczej;

- Podinspektor ds. kultury, sportu, turystyki i promocji gminy, Urząd Miejski w Nowogrodzie, Członek Grupy Roboczej;
- Zastępca Wójta Gminy Łomża, Urząd Gminy Łomża, Członek Grupy Roboczej;
- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Urząd Gminy Łomża, Członek Grupy Roboczej;
- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych, Urząd Gminy Piątnica, Członek Grupy Roboczej;
- Główny Specjalista Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych, Urząd Gminy Piątnica, Członek Grupy Roboczej.

Do zadań Grupy Roboczej należy:

- wprowadzanie korekt i wstępna akceptacja projektów poszczególnych etapów opracowania dokumentów niezbędnych do realizacji ZIT, aktualizacji Strategii ZIT oraz innych niezbędnych dokumentów koniecznych do opracowania aktualizacji Strategii ZIT, jak również wdrażania projektów w ramach związku ZIT;
- dostarczanie danych i wkładu merytorycznego na potrzeby wdrażania Strategii ZIT (ze zmianami); aktualizacji Strategii ZIT oraz innych niezbędnych dokumentów koniecznych do opracowania aktualizacji Strategii ZIT,
- organizacja spotkań i warsztatów, procesu uspołecznienia strategii, konsultacji społecznych i innych wymaganych elementów procesu przygotowania dokumentów niezbędnych do realizacji ZIT, aktualizacji Strategii ZIT oraz innych niezbędnych dokumentów koniecznych do opracowania aktualizacji Strategii ZIT, jak również wdrażania projektów w ramach związku ZIT;
- prowadzenie dokumentacji prac nad dokumentami niezbędnymi do realizacji ZIT, aktualizacji Strategii ZIT oraz innych niezbędnych dokumentów koniecznych do opracowania aktualizacji Strategii ZIT, jak również wdrażania projektów w ramach związku ZIT na potrzeby związku ZIT;
- inne czynności konieczne do przygotowania dokumentów niezbędnych do realizacji ZIT, aktualizacji Strategii ZIT oraz innych niezbędnych dokumentów koniecznych do opracowania aktualizacji Strategii ZIT, jak również wdrażania projektów w ramach związku ZIT.

Zespół doradczy partnerów społeczno-gospodarczych

16 października 2024 r. Komitet Sterujący związku ZIT powołał Zespół doradczy partnerów społeczno-gospodarczych ZIT MOF Miasta Łomży (Zarządzenie nr 1/2024 Komitetu Sterującego Związku ZIT). Skład Zespołu doradczego partnerów społeczno-gospodarczych został zaktualizowany Zarządzeniem nr 1/2026 komitetu Sterującego Związku ZIT w dniu 19.05.2026 r.

Zespół doradczy partnerów społeczno-gospodarczych stanowi wewnętrzną formę organizacyjną ZIT MOF Miasta Łomży, przewidzianą w Strategii ZIT oraz w § 8 Porozumienia Międzygminnego zmieniającego Porozumienie Międzygminne z dnia 01.03.2024 r. w sprawie kontynuacji współpracy w ramach związku ZIT oraz określenia zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży, służących realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zawartego przez Miasto Łomża, Gminę Łomża, Gminę Nowogród i Gminę Piątnica w dniu 25 marca 2026 r.

W skład zespołu doradczego partnerów społeczno-gospodarczych wchodzi w szczególności przedstawiciele podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji, działających na terenie MOF Miasta Łomży.

W skład zespołu doradczego partnerów społeczno-gospodarczych weszli przedstawiciele następujących podmiotów z terenu MOF Miasta Łomży:

- Akademia Łomżyńska;
- Caritas Diecezji Łomżyńskiej;
- Centrum Kultury Gminy Łomża;

- Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży;
- Dzienny Dom Pobytu Senior Wigor w Górkach Sypniewo;
- Gminny ZOSP RP i Rada Powiatu Łomżyńskiego;
- Koło Gospodyń Wiejskich Czarnocin nad Narwią w Czarnocinie;
- Koło Gospodyń Wiejskich w Górkach Sypniewo;
- Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie;
- Łomżyńska Rada Seniorów;
- Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie;
- MPK Sp. z o.o. w Łomży;
- Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie;
- Nadleśnictwo Łomża;
- Nadleśnictwo Nowogród;
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy;
- Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża;
- Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łomża ds. współpracy międzynarodowej;
- Podlaski Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża;
- Powiatowy Urząd Pracy w Łomży;
- Przedsiębiorca;
- Urząd Gminy Łomża;
- Urząd Gminy Piątnica;
- Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża.

Do zadań zespołu doradczego partnerów społeczno-gospodarczych należy:

- a) udział w organizowanych spotkaniach i warsztatach związanych z aktualizacją i ewaluacją Strategii ZIT (ze zmianami), inicjowanie prac nad ewentualną modyfikacją Strategii ZIT;
- b) opiniowanie zmian Strategii ZIT, opiniowanie raportu z ewaluacji ex-post Strategii ZIT.

3. Główne założenia Strategii ZIT MOF Miasta Łomży

Wizja obszaru MOF Miasta Łomży w 2030 roku:

DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCY SIĘ, OTWARTY NA ŚWIAT I GOŚCINNY SILNY OŚRODEK SUBREGIONALNY, W KTÓRYM CZYSTE ŚRODOWISKO, WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI I ZRÓWNOWAŻONA MOBILNOŚĆ ZAPEWNIĄJĄ WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA ZINTEGROWANYM I AKTYWNYM MIESZKAŃCOM.

Misja Strategii opisuje mandat do realizacji wizji rozwoju oraz ukazuje nadrzędne wartości (zasady), jakimi będą się kierować operatorzy Strategii ZIT podejmując działania na rzecz realizacji wizji. Misja stanowi opis sposobu postępowania w celu urzeczywistnienia wizji.

Misją partnerstwa jest:

WSPÓLNOTA MIESZKAŃCÓW, CZERPIĄC Z LOKALNEGO DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO, KIERUJE SIĘ ZASADAMI RÓWNOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚCI I WZAJEMNEGO ZAUFANIA, BUDUJE PRZYSZŁOŚĆ WŁASNĄ I KOLEJNYCH POKOLEŃ WE WSPÓLNEJ EUROPIE.

Z wizji i misji wynikają cele strategiczne i kierunki działań. W trakcie prac nad Strategią ZIT podjęto decyzję o przyjęciu czterech strategicznych celów rozwoju, które są konkretyzacją wizji rozwoju MOF Miasta Łomży:

- Cel strategiczny 1. Wzrost dostępności komunikacyjnej.
- Cel strategiczny 2. Poprawa ochrony środowiska i dostosowanie do zmian klimatu.
- Cel strategiczny 3. Wzrost jakości edukacji.
- Cel strategiczny 4. Zintegrowany rozwój społeczny.

Wymienione wyżej cele strategiczne będą osiągnięte poprzez realizację kierunków działań:

Tabela 1 Struktura celów strategicznych i kierunków działań

CELE STRATEGICZNE	KIERUNKI DZIAŁAŃ
1. Wzrost dostępności komunikacyjnej	1.1. Zrównoważona mobilność miejska
2. Poprawa ochrony środowiska i dostosowanie do zmian klimatu	2.1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej
	2.2. Produkcja energii z OZE
	2.3. Dostosowanie do zmian klimatu
3. Wzrost jakości edukacji	3.1. Edukacja przedszkolna
	3.2. Edukacja szkolna wysokiej jakości
4. Zintegrowany rozwój społeczny	4.1. Ochrona i promocja walorów turystycznych
	4.2. Włączenie społeczne

Tabela 2 Lista projektów nabór konkurencyjny/niekonkurencyjny

L.p.	Cel polityki	Cel szczegółowy	Tryb naboru (konkurencyjny / niekonkurencyjny)	Nazwa projektu	Beneficjent	Wartość całkowita (euro)	Wartość dofinansowania (euro)	Źródło finansowania (EFRR/ EFS+)
1	CP2	2 (i)	konkurencyjny	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w MOF Miasta Łomży	Miasto Łomża Gmina Piątnica Gmina Łomża	12 109 798,68	10 293 328,88	EFRR
2	CP2	2 (ii)	konkurencyjny	Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w MOF Miasta Łomży	Miasto Łomża Gmina Piątnica Gmina Łomża Gmina Nowogród	3 373 263,00	2 867 273,55	EFRR
3	CP2	2 (iv)	konkurencyjny	Adaptacja do zmian klimatu terenów w MOF Miasta Łomży	Miasto Łomża Gmina Łomża Gmina Nowogród	11 038 360,07	9 382 606,06	EFRR
4	CP4	4 (iii)	konkurencyjny	Infrastruktura społeczna w MOF Miasta Łomży (Kluby seniora)	Miasto Łomża Gmina Piątnica Gmina Łomża	2 079 124,70	1 767 256,00	EFRR
5	CP5	5 (i)	konkurencyjny	Przebudowa, rozbudowa, remont budynków przeznaczonych do prowadzenia działalności kulturalnej w MOF Miasta Łomży	Miasto Łomża Gmina Piątnica Gmina Nowogród	1 272 743,88	1 081 832,30	EFRR
6	CP5	5 (i)	konkurencyjny	Budowa bulwarów nad Narwią	Miasto Łomża	1 281 373,76	1 089 167,70	EFRR

7	CP2	2 (viii)	konkurencyjny	Rozbudowa sieci tras rowerowych wraz z infrastrukturą	Miasto Łomża	5 470 588,24	4 650 000,00	EFRR
8	CP4	4(f)	konkurencyjny	Działania w obszarze edukacji przedszkolnej w MOF Miasta Łomży	Miasto Łomża Gmina Piątnica Gmina Łomża Gmina Nowogród	1 179 658,21	1 061 692,39	EFS+
9	CP4	4(f)	konkurencyjny	Działania w obszarze kształcenia ogólnego w MOF Miasta Łomży	Miasto Łomża Gmina Piątnica Gmina Łomża Gmina Nowogród	2 812 481,65	2 531 233,48	EFS+
10	CP4	4(f)	niekonkurencyjny	Zostanę Fachowcem	Miasto Łomża	1 077 315,81	969 584,23	EFS+
11	CP2	2(viii)	konkurencyjny	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży	Miasto Łomża	9 555 555,56	6 603 432,70	EFRR

Tabela 3 Źródła finansowania wg celów strategicznych

Cel strategiczny	Wartość [EUR]	Dofinansowanie [EUR]	Wkład własny [EUR]
1. Wzrost dostępności komunikacyjnej	15 026 143,80	11 253 432,70	3 772 711,10
2. Poprawa ochrony środowiska i dostosowanie do zmian klimatu	26 521 421,75	22 543 208,49	3 978 213,26
3. Wzrost jakości edukacji	5 069 455,67	4 562 510,10	506 945,57
4. Zintegrowany rozwój społeczny	4 633 242,34	3 938 256,00	694 986,34
Razem	51 250 263,56	42 297 407,29	8 952 856,27

Tabela 4 Źródła finansowania wg programów

Źródła finansowania	Fundusz	Wartość [EUR]	Dofinansowanie [EUR]	Wkład własny [EUR]
FEdP 2021-2027	EFS+	5 069 455,67	4 562 510,10	506 945,57
FEdP 2021-2027	EFRR	36 625 252,33	31 131 464,49	5 493 787,84
FEPW 2021-2027	EFRR	9 555 555,56	6 603 432,70	2 952 122,86
		51 250 263,56	42 297 407,29	8 952 856,27

Tabela 5 Wydatki wg Partnerów

Partner	Wartość [EUR]	Dofinansowanie [EUR]	Wkład własny [EUR]
Miasto Łomża	35 769 870,18	29 044 967,07	6 724 903,11
Gmina Łomża	6 128 721,54	5 246 670,02	882 051,52
Gmina Nowogród	3 333 735,00	2 853 940,64	479 794,36
Gmina Piątnica	6 017 936,84	5 151 829,56	866 107,28
Razem	51 250 263,56	42 297 407,29	8 952 856,27

4. Wdrażanie Strategii ZIT MOF Miasta Łomży

W zakresie realizacji Strategii ZIT MOF Miasta Łomży jako całości oraz w zakresie realizacji projektów ZIT zaplanowane zostały cztery rodzaje monitoringu:

- operacyjny (opis stanu realizacji zaplanowanych działań dla każdego z kierunków działań i celów),
- strategiczny (kontrola osiągnięcia wskaźników realizacji),
- źródeł finansowania (opis ryzyk pozyskania środków na realizację).
- finansowy obejmujący analizę wydatkowanych środków finansowych.

4.1. Porozumienie w sprawie realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

20 czerwca 2024 r. zostało podpisane Porozumienie między Zarządem Województwa Podlaskiego, a Związkiem ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży w sprawie realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Zgodnie z porozumieniem wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie ZIT MOF Miasta Łomży w ramach FEoP 2021-2027 wynosi: 35 693 973,55 euro, w tym środki EFRR: 31 131 463,55 euro, EFS+: 4 562 510,00 euro.

Tabela 6 Podział alokacji w ramach Związku ZIT MOF Miasta Łomży

Priorytet w ramach FEoP 2021-2027	Cel polityki i cel szczegółowy	Nr i nazwa działania w SZOP FEoP 2021-2027	Alokacja środków ZIT (EUR)
Priorytet II Region przyjazny środowisku	CP2 i	Działanie 2.3 Zintegrowana terytorialnie efektywność energetyczna	10 293 328,00
Priorytet II Region przyjazny środowisku	CP2 ii	Działanie 2.6 Zintegrowana terytorialnie energia odnawialna	2 867 273,55
Priorytet II Region przyjazny środowisku	CP2 iv	Działanie 2.8 Zintegrowana terytorialnie adaptacja do zmian klimatu	9 382 606,00
Priorytet VI Zrównoważona mobilność miejska	CP2 viii	Działanie 6.2 Zintegrowana terytorialnie mobilność miejska	4 650 000,00
Priorytet IV Przestrzeń społeczna wysokiej jakości	CP 4 iii	Działanie 4.4 Zintegrowane terytorialnie inwestycje społeczne	1 767 256,00
Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego	CP 4 f	Działanie 8.2 Zintegrowany terytorialnie rozwój edukacji i kształcenia	4 562 510,00
Priorytet V Zrównoważony rozwój terytorialny	CP5 i	Działanie 5.2 Zintegrowana terytorialnie kultura i turystyka miejska	2 171 000,00

Tabela 7 Podział alokacji Związku ZIT MOF Miasta Łomży w zakresie celów finansowych realizacji Strategii ZIT

Cel finansowy	Rok	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
	EFRR [EUR]	4 669 719,53	15 565 731,78	21 792 024,49	29 574 890,37
	EFS+ [EUR]	684 376,50	2 281 255,00	3 193 757,00	4 334 384,50
	Procent alokacji	15%	50%	70%	95%

4.2. Opis stanu realizacji zaplanowanych działań w ramach Strategii ZIT oraz źródła finansowania.

Osiągnięciu misji i wizji Strategii Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży służy realizacja czterech celów strategicznych Strategii ZIT. Tabela nr 8 przedstawia stan zaawansowania realizacji zadań w poszczególnych gminach MOF, które przyczynią się do realizacji celów strategicznych wskazanych w Strategii wraz ze źródłami finansowania.

Tabela 8 Stan zaawansowania realizacji zadań Strategii ZIT na dzień 31.03.2026 r. oraz źródła finansowania.

L-p.	Nazwa projektu	Nazwa zadania	Beneficjent	Całkowita wartość projektu (euro)	Dofinansowanie (euro)	Fundusz (EFRR/EFSA)	Cele/kierunki działań w Strategii terytorialnej, w które wpisują się projekty	Stan realizacji
1		Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Łomża	Miasto Łomża	7 661 568,46	6 512 333,19			Status projektu: Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 31.03.2025 r. w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet II. Region przyjazny środowisku, Działanie 2.3 Zintegrowana terytorialnie efektywność energetyczna. Wartość całkowita zadania: 18 099 479,26 zł. Wartość dofinansowania: 9 724 173,41 zł. W dniu 14.04.2026r. zakończono ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie, planowane ogłoszenie wyników V.2026r., podpisanie Umowy o dofinansowanie w VI.2026r. Gotowość do realizacji: Dokumentacja kompletna, prawomocne pozwolenie na budowę. Termin realizacji projektu: 2026-2028r. Problemy: Niewyczerpana została całkowita alokacja w ogłoszonym pierwszym naborze do 31.03.2025r. Drugi nabór zaplanowano w terminie 23.01.2026r. - 30.09.2026r.
2	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w MOF Miasta Łomży	Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Piątnica	Gmina Piątnica	3 264 642,81	2 774 946,39	EFRR	Cel 2. Poprawa ochrony środowiska i dostosowanie do zmian klimatu	Status projektu: Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 30.03.2025 r. w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet II. Region przyjazny środowisku, 2.3. Zintegrowana terytorialnie efektywność energetyczna. Wartość całkowita zadania: 6 757 709,89 zł. Wartość dofinansowania: 5 539 614,73 zł. Wniosek oceniony pozytywnie. Gmina oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie. Gotowość do realizacji: Dokumentacja kompletna. W trakcie aktualizacji wniosku o dofinansowania do umowy z UMWP zostanie zmieniona data realizacji inwestycji. W trakcie opracowywania dokumentacji przetargowa. Termin realizacji projektu: 04.11.2024 r.-30.06.2028 r. Problemy: Niewyczerpana została całkowita alokacja w ogłoszonym I naborze do 31.03.2025 r. Drugi nabór zaplanowano w terminie 23.01.2026r. - 30.09.2026r.
3		Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Łomża	Gmina Łomża	1 183 587,41	1 006 049,30			Status projektu: Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 31.03.2025 r. w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet II. Region przyjazny środowisku, Działanie 2.3. Zintegrowana terytorialnie efektywność energetyczna. Wartość całkowita: 1 965 575,18 zł. Wartość dofinansowania: 1 375 902,59 zł. Wniosek oceniony pozytywnie. Gmina oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie. Gotowość do realizacji: Dokumentacja kompletna. Gmina posiada prawomocne pozwolenie na budowę. Termin realizacji projektu: 11.09.2024 r. - 31.12.2027 r. Problemy: Brak

4	Inwestycje związane z OZE na obiektach użyteczności publicznej w Mieście Łomża	Miasto Łomża	950 588,24	808 000,00			Status projektu: Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 19.12.2025 r. w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet II Region przyjazny środowisku, Działanie 2.6. Zintegrowana terytorialnie energia odnawialna. Wartość całkowita: 2 472 891,27 zł. Wartość dofinansowania: 1 638 685,31 zł. Wniosek w trakcie oceny. Gotowość do realizacji: Dokumentacja kompletna. Termin realizacji projektu: 20.10.2025r. - 31.10.2027r. Problemy: Brak
5	Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w MOF Miasta Łomży	Gmina Łomża	1 050 000,00	892 500,00	EFRR	Cel 2. Poprawa ochrony środowiska i dostosowanie do zmian klimatu	Status projektu: Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w okresie 31.07.2026 r. - 30.09.2026 r. w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet II Region przyjazny środowisku, Działanie 2.6. Zintegrowana terytorialnie energia odnawialna. Gotowość do realizacji: Gmina nie posiada dokumentacji projektowej. Pozwolenie na budowę - nie jest wymagane. Na dzień dzisiejszy Gmina posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele realizacji inwestycji. We wrześniu 2025 r. została powołana spółdzielnia energetyczna. Gmina posiada Analizę rozwoju spółdzielni energetycznej, która przedstawia m.in.: parametry instalacji fotowoltaicznych i zapotrzebowanie na energię. Termin realizacji projektu: 2026 r. - 2027 r. Problemy: Długi okres oczekiwania na dokumentację techniczną. Zadanie nie będzie realizowane. Środki po zmianie Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 zostaną przeniesione na nowe cele.
6	Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obiektach użyteczności publicznej w gminie Piątnica	Gmina Piątnica	870 000,00	739 500,00			Zadanie nie będzie realizowane. Środki po zmianie Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 zostaną przeniesione na nowe cele.
7	Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obiektach użyteczności publicznej w gminie Nowogród	Gmina Nowogród	502 674,76	427 273,55			Zadanie nie będzie realizowane. Środki po zmianie Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 zostaną przeniesione na nowe cele.
8	Adaptacja do zmian klimatu terenów w MOF Miasta Łomży	Miasto Łomża	6 986 204,07	5 938 273,46	EFRR	Cel 2. Poprawa ochrony środowiska i dostosowanie do zmian klimatu	Status projektu: Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 14.10.2025 r. w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet II Region przyjazny środowisku, Działanie 2.8. Zintegrowana terytorialnie adaptacja do zmian klimatu. Wartość całkowita zadania: 29 773 803,95 zł. Wartość dofinansowania: 24 959 379,82 zł. Umowa o dofinansowanie nr FEPD.02.08-IZ.00-0003/25-00 zawarta została w dniu 18.03.2026 r.

							Stan realizacji: Zadanie obejmuje budowę bulwarów nad Narwią w łomży na odcinku od istniejących bulwarów do zbiornika retencyjnego przy ul. Jazd w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Na dzień 31.03.2026 r. nie została zawarta umowa z Wykonawcą na rzeczową realizację projektu. Aktualnie trwa ponowne badanie ofert w ramach procedury odwoławczej. Termin realizacji projektu: 18.03.2026r. - 30.06.2028r. Problemy: Brak
9	Adaptacja terenów wsi Stara Łomża przy Szosie i Stara Łomża nad Rzeką do zmian klimatu	Gmina Łomża	2 100 000,00	1 785 000,00			Status projektu: Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 28.11.2024 r. w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet II Region przyjazny środowisku, Działanie 2.8. Zintegrowana terytorialnie adaptacja do zmian klimatu. Wartość całkowita zadania: 4 180 444,40 zł. Wartość dofinansowania: 3 553 377,74 zł Umowa o dofinansowanie Nr FEPD.02.08-IZ.00-0001/24-00 została podpisana w dniu 04.12.2024 r. Stan realizacji: Projekt zakłada adaptację do zmian klimatu terenów wsi Stara Łomża przy Szosie i Stara Łomża nad Rzeką. Projekt zakłada budowę trzech zbiorników retencyjnych roszcążająco-odparowujących wraz z infrastrukturą. Ponadto projekt zakłada przeprowadzenie działań podnoszących świadomość społeczeństwa oraz edukacyjnych. Na dzień 31.03.2026 r. w ramach projektu wydatkowano kwotę: 1 415 347,23 zł brutto (wydatki kwalifikowalne – 1 415 347,23 zł; dofinansowanie: 1 203 045,14 zł). Termin realizacji projektu: 05.08.2025 r. - 31.12.2027 r. Problemy: Kolejny nabór: wrzesień – grudzień 2026 r.
10	Adaptacja wąwozu w Nowogrodzie do zmian klimatu (m.in. odwodnienie sieci dróg w Nowogrodzie. Stworzenie zielonego korytarza w Nowogrodzie)	Gmina Nowogród	1 952 156,00	1 659 332,60			Zadanie nie będzie realizowane. Środki po zmianie Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 zostaną przeniesione na nowe cele.
11	Rozbudowa sieci tras rowerowych wraz z infrastrukturą	Miasto Łomża	5 470 588,24	4 650 000,00	EFRR	Cel 1. Wzrost dostępności komunikacyjnej	Status projektu: Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w okresie 31.07.2026r. - 23.09.2026r. w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet VI Zrównoważona mobilność miejska, Działanie 6.2 Zintegrowana terytorialnie mobilność miejska. Gotowość do realizacji: Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania od dnia 08.06.2026 r. (bez ZRID oraz bez pozwolenia na budowę). Termin realizacji projektu: 2026r. - 2028 r. Problemy: Brak

12	Klub seniora w łomży ul. M. Skłodowskiej- Curie 2	Miasto Łomża	500 182,35	425 155,00		Status projektu: Wniosek złożony w dniu 12.05.2025r. Wartość całkowita: 602.328,67 EUR, dofinansowanie: 425.123,58 EUR (max. dof. 425.155,00 EUR). Wniosek wycofany, zostanie ponownie złożony po opracowaniu aktualizacji dokumentacji w naborze ciągłym wniosków o dofinansowanie w terminie do 30.09.2026r. zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet IV. Przestrzeń społeczna wysokiej jakości, Działanie 4.4 Zintegrowana terytorialnie inwestycja społeczne. Gotowość do realizacji: Dokumentacja w aktualizacji. Termin realizacji projektu: 2027r. Problemy: Brak
13	Poprawa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Łomża (kluby seniora)	Gmina Łomża	1 050 000,00	892 500,00	EFRR	Status projektu: Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w okresie 26.03.2026 r. - 30.09.2026 r. w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet IV. Przestrzeń społeczna wysokiej jakości, Działanie 4.4 Zintegrowana terytorialnie inwestycja społeczne. Gotowość do realizacji: Gmina posiada kompletną dokumentację projektową; Gmina posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu; postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - planowany termin wszczęcia postępowania – styczeń 2027 r. Termin realizacji projektu: 2027 r.-2028 r. Problemy: Długi okres oczekiwania na dokumentację techniczną.
14	Budowa Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Piątńcu	Gmina Piątńca	528 942,35	449 601,00		Status projektu: Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 13.05.2025 r. w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet IV. Przestrzeń społeczna wysokiej jakości, Działanie 4.4 Zintegrowana terytorialnie inwestycja społeczne. Wartość całkowita zadania: 3 024 631,17 zł. Wartość dofinansowania: 1 866 231,00 zł. Wniosek niewybrany do dofinansowania z powodu negatywnej oceny formalnej. Do wniosku przedłożono kosztorys szacunkowy na roboty budowlane. Przedłożony kosztorys zmniejszył wartość projektu powyżej 5%. 30.04.2026 r. ponownie złożono wniosek o dofinansowanie. Wartość całkowita zadania: 3 145 616,42 zł. Wartość dofinansowania: 1 887 369,85 zł. Trwa ocena wniosku. Gotowość do realizacji: Gmina posiada pełną dokumentację, w tym pozwolenie na budowę budynku na Dom Seniora. Termin realizacji projektu: 2027 r.-2029 r. Problemy: brak
15	Działania w obszarze edukacji przedszkolnej w MOF Miasta Łomży	Miasto Łomża	611 111,11	550 000,00	EFS+	Status projektu: Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 17.03.2025r. w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet VIII. Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.2 Zintegrowany terytorialnie rozwój edukacji i kształcenia. Wartość całkowita zadania: 2 837 651,39 zł. Wartość dofinansowania: 2 390 734,79 zł. Wniosek niewybrany do dofinansowania z powodów merytorycznych. Kolejny wniosek złożony został w dniu 03.10.2025 r. Wartość całkowita zadania: 2 536 973,04 zł. Wartość dofinansowania: 2 155 158,04 zł. Wniosek również niewybrany do dofinansowania z powodów merytorycznych. Kolejne planowane złożenie wniosku o dofinansowanie do dnia 22.05.2026 r. Gotowość do realizacji: Zadanie gotowe do realizacji. Termin realizacji projektu: 01.09.2026 r. – 30.06.2028 r.

16	Akademia Przedszkolaka w Gminie Piątnica	Gmina Piątnica	176 638,89	158 975,00	Problemy: Duża liczba jednostek objętych wsparciem, charakteryzujących się różnicowanymi potrzebami oraz zakresem zapotrzebowania. Status projektu: Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 28.02.2025r. w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet VIII. Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.2 Zintegrowany terytorialnie rozwój edukacji i kształcenia. Wartość całkowita: 714 908,61 zł. Wartość dofinansowania: 607 422,03 zł. Wniosek niewybrany do dofinansowania z powodów nieosiągnięcia wymaganej liczby punktów w ocenie merytorycznej. Kolejny wniosek złożono 05.10.2025 r. Wartość całkowita: 730 771,99 zł, Wartość dofinansowanie: 607 442,07 zł. Wniosek w trakcie oceny. Gotowość do realizacji: Zadanie gotowe do realizacji. Termin realizacji projektu: 01.08.2026 r.-30.09.2028 r. Problemy: brak
17	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Łomża	Gmina Łomża	259 661,83	233 695,65	Status projektu: Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 17.03.2025 r. w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet VIII. Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.2 Zintegrowany terytorialnie rozwój edukacji i kształcenia. Wartość całkowita: 1 239 236,05 zł, Wartość dofinansowania: 1 014 436,05 zł. Wniosek niewybrany do dofinansowania z powodu niespełnienia kryteriów merytorycznych (nie uzyskanie wymaganej, minimalnej liczby punktów). Kolejny wniosek złożono 03.10.2025 r. Wartość całkowita: 1 165 158,12 zł. Wartość dofinansowania: 968 758,12 zł. Wniosek w trakcie negocjacji. Gotowość do realizacji: Zadanie gotowe do realizacji. Termin realizacji projektu: 01.07.2025 r. - 31.11.2029 r. Problemy: brak
18	Bystrzaki w akcji - nauka z pasją. Wsparcie w zakresie edukacji przedszkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie	Gmina Nowogród	132 246,38	119 021,74	Status projektu: Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 26.02.2025r. w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet VIII. Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.2 Zintegrowany terytorialnie rozwój edukacji i kształcenia. Wartość całkowita: 633 500,00 zł. Wartość dofinansowania: 538 475,00 zł. Wniosek niewybrany do dofinansowania z powodu negatywnej oceny merytorycznej. Kolejny wniosek złożono nastąpiło 29.09.2025 r. Wartość całkowita: 597 900,94 zł. Wartość dofinansowania: 507 900,94 zł. Wniosek również niewybrany został do dofinansowania z powodu negatywnej oceny merytorycznej. Planowane złożenie wniosku po ogłoszeniu naboru w terminie: 09.04.2026-22.05.2026 r. Gotowość do realizacji: Zadanie gotowe do realizacji. Termin realizacji projektu: 01.10.2026r.-30.06.2029 r. Problemy: Brak
19	Zostaną Fachowcem - projekt zgodny ze Strategią Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomża	Miasto Łomża	1 077 315,81	969 584,23	Status projektu: Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 31.10.2024r. w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet VIII. Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.2 Zintegrowany terytorialnie rozwój edukacji i kształcenia. Wartość całkowita: 4 899 546,72 zł, wartość dofinansowania: 4 350 426,72 zł. Umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 01.09.2025r. Stan realizacji: Na dzień 31.03.2026 r. w ramach projektu wydatkowano kwotę 262

									783,47 zł brutto, w tym wydatki kwalifikowalne: 262 783,47 zł oraz dofinansowanie: 192 223,47 zł. Termin realizacji projektu: 01.09.2025 r. – 31.12.2027 r. Problemy: Brak
20		Edukacja Przyszłością	Miasto Łomża	1 498 911,99	1 349 020,79				Status projektu: Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 16.01.2025r. w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet VIII. Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.2. Zintegrowany terytorialnie rozwój edukacji i kształcenia. Wartość całkowita: 6 883 575,59 zł, Wartość dofinansowania: 6 100 375,59 zł. Wniosek niewybrany do dofinansowania z powodów merytorycznych Kolejne składanie wniosku nastąpiło 30.09.2025 r. Wartość całkowita: 6 407 977,53 zł, Wartość dofinansowania: 5 746 872,53 zł. Wniosek niewybrany do dofinansowania również z powodów merytorycznych. Kolejny wniosek złożono 17.04.2026 r. Wartość całkowita projektu wynosi 7 298 748,42 zł, natomiast wartość dofinansowania: 6 193 083,42 zł. Gotowość do realizacji: Zadanie gotowe do realizacji. Termin realizacji projektu: 01.06.2026 r. – 30.06.2028 r. Problemy: Duża liczba jednostek objętych wsparciem, charakteryzujących się zróżnicowanymi potrzebami oraz zakresem zapotrzebowania.
21	Działania w obszarze kształcenia ogólnego w MOF Miasta Łomży	Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych w gminie Piątnica	Gmina Piątnica	555 025,97	499 523,37	EFS+	Cel 3. Wzrost jakości edukacji		Status projektu: Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 26.02.2025r. w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet VIII. Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.2. Zintegrowany terytorialnie rozwój edukacji i kształcenia. Wartość całkowita: 2 027 016,64 zł, Wartość dofinansowania: 1 804 455,52 zł. Umowa o dofinansowanie FEPO.08.02-IZ.00-0002/25-00 z dnia 22.12.2025 r. Stan realizacji: Rozpoczęto realizację zajęć z zakresu edukacji przyrodniczej, kulturoznawczych, zajęć dodatkowych i wyrównawczych. Na dzień 31.03.2026 r. w ramach projektu wydatkowano kwotę: 0,00 zł brutto (wydatki kwalifikowalne -0,00zł ;dofinansowanie: 0,00zł). Termin realizacji projektu: 01.08.2025 r.-30.11.2027 r. Problemy: znaczna część wydatków w ramach cross financing i zakupów pomocy dydaktycznych została zdeaktualizowana
22		Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Łomża	Gmina Łomża	485 472,30	436 925,07				Status projektu: Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 17.03.2025 r. w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet VIII. Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.2. Zintegrowany terytorialnie rozwój edukacji i kształcenia. Wartość całkowita: 2 474 776,49 zł. Wartość dofinansowania: 1 976 376,49 zł. Wniosek niewybrany do dofinansowania z powodu niespełnienia kryteriów merytorycznych (wniosek nie uzyskał minimalnej liczby wymaganych punktów). Kolejny wniosek złożono 30.09.2025 r. Wartość całkowita: 2 071 284,53 zł. Wartość dofinansowania: 1 860 724,53 zł. Po aktualizacji wniosku o dofinansowanie wartość projektu wynosi: 1 981 585,01 zł, dofinansowanie: 1 771 025,01. Wniosek w trakcie oceny. Gotowość do realizacji: Zadanie gotowe do realizacji. Termin realizacji projektu: 01.05.2026 r. - 31.12.2029 r. Problemy: Brak

23	Rozwój kształcenia ogólnego w Gminie Nowogród	Gmina Nowogród	273 071,39	245 764,25		Status projektu: Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 26.02.2025r. w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet VIII. Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.2 Zintegrowany terytorialnie rozwój edukacji i kształcenia. Wartość całkowita: 1 236 048,00 zł, Wartość dofinansowania: 1 112 128,00 zł. Umowa o dofinansowanie nr UDA-FEPD.0802-IZ.00-0003/25-00 podpisana została w dniu 28.11.2025r. Stan realizacji: Projekt zakłada wsparcie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów ZSS w Nowogrodzie, w tym umiejętności cyfrowych, językowych, matematycznych, społecznych oraz kompetencji w zakresie uczenia się, poprzez realizację programu edukacyjnego, a także wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli. Na dzień 31.03.2026 r. w ramach projektu wydatkowano kwotę: 207 931,67 zł brutto (wydatki kwalifikowalne - 207 931,67zł ;dofinansowanie: 171 291,67zł brutto). Termin realizacji projektu: 01.10.2025r.-30.06.2028r. Problemy: Brak
24	Przebudowa, rozbudowa, remont budynków przeznaczonych do prowadzenia działalności kulturalnej w MOF Miasta Łomży	Miasto Łomża	176 470,59	150 000,00	Cel 4. Zintegrowany rozwój społeczny EFRR	Status projektu: Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 24.12.2024r. w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet: V. Zrównoważony rozwój terytorialny, Działanie 5.2. Zintegrowana terytorialnie kultura i turystyka miejska. Wartość całkowita zadania: 1 298 145,22 zł. Wartość dofinansowania: 646 476,31 zł. Umowa o dofinansowanie nr FEPD.05.02-IZ.00-0005/24-00 podpisana została w dniu 30.07.2025r., Aneks nr UDA-FEPD.05.02-IZ.00-0005/24-01 z dnia 12.01.2026r., Aneks nr FEPD.05.02-IZ.00-0005/24-02 z dnia 22.04.2026r. Stan realizacji: Przedmiotem projektu była przebudowa MBP Filia nr 2, która obejmowała powiększenie istniejącej biblioteki znajdującej się przy ul. Księżnej Anny 2, poprzez połączenie dwóch lokali tj. istniejącej biblioteki (pow. 163,47m2) i przyległego lokalu usługowego (pow. 103,82m2), które znajdują się na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Po przebudowie biblioteka posiada powierzchnię użytkową 267,29m2. Zadanie zrealizowane w całości. Zakończenie projektu nastąpiło 30.12.2025r. Na dzień 30.12.2025 r. w ramach projektu wydatkowano kwotę: 1 236 328,78 zł brutto (wydatki kwalifikowalne – 1 236 328,780 zł; dofinansowanie: 615.691,73 zł) Termin realizacji projektu: 24.06.2025r.- 30.12.2025r. Problemy: Brak
25	Remont budynku M-GOK w Nowogrodzie pełniącego rolę kulturoznawczą i rolę ośrodka życia kulturalnego w Gminie Nowogród	Gmina Nowogród	473 586,47	402 548,50		Status projektu: Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 28.11.2025 r. w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet: V. Zrównoważony rozwój terytorialny, Działanie 5.2 Zintegrowana terytorialnie kultura i turystyka miejska. Wartość całkowita zadania: 2 867 410,35 zł. Wartość dofinansowania: 1 972 778,31 zł. Wniosek jest w trakcie oceny. Gotowość do realizacji: Gmina Nowogród posiada gotową dokumentację projektową, pozwolenie na prowadzenie robót od Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Łomży. Termin realizacji projektu: 01.07.2026r.-30.06.2027r.

									Problemy: Brak
									Status projektu: Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 30.12.2024r. w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet: V. Zrównoważony rozwój terytorialny, Działanie 5.2. Zintegrowana terytorialnie kultura i turystyka miejska. Wartość całkowita zadania: 2 427 547,30 zł, Dofinansowanie: 2 061 168,50 zł. Umowa o dofinansowanie nr FEPD.05.02.-IZ.00-0006/24-00 z dnia 30.07.2025 r. Stan realizacji: Zakres zadania obejmuje remont wraz z wyposażeniem Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy tj. roboty demontażowe i rozbiórkowe, roboty posadzarskie podłoga, demontaż sceny, roboty wykończeniowe na ścianach i sufitach w sali widowiskowej, demontaż w branży elektrycznej, instalacje podtynkowe elektryczne, instalacje podtynkowe niskoprądowe, wieża widokowa: rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych, rozebranie obróbek blacharskich, rozebranie płyty dachowej, roboty rozbiórkowe wewnątrz, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej, instalacja wod-kan z urządzeniami, Instalacja c.o., instalacja wentylacji mechanicznej. Na dzień 31.03.2026r. wydatkowano kwotę: 64 400,00 zł, w tym koszty kwalifikowalne – 61 756,83 zł i dofinansowanie: 52 493,31 zł Termin realizacji projektu: 2025r.-2026r. Problemy: Z uwagi na zły stan budynku – niezbędne będą dodatkowe roboty budowlane i dla branży elektrycznej i sanitarnej– jakich na etapie projektowania i planowania inwestycji nie można było przewidzieć bez dokonania rozbiórki.
26	Remont wraz z wyposażeniem Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy pełniącego rolę kulturoznawczą i rolę ośrodka życia kulturalnego w Gminie Piątnica	Gmina Piątnica	622 686,82	529 283,80					Status projektu: Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 09.10.2025r. w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet V. Zrównoważony rozwój terytorialny. 5.2. Zintegrowana terytorialnie kultura i turystyka. Wartość całkowita zadania: 5 460 957,42 zł. Wartość dofinansowania: 4 630 891,86 zł. W dniu 09.04.2026r. zakończono ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie. W dniu 14.04.2026r. Uchwałą nr 160/3240/2026 Zarządu Województwa Podlaskiego zaakceptowano projekt do dofinansowania. Aktualnie trwa etap podpisania Umowy o dofinansowanie. Stan realizacji: Zadanie obejmuje budowę bulwarów nad Narwią w Łomży na odcinku od istniejących bulwarów do zbiornika retencyjnego przy ul. Zjazd w zakresie turystyki. Dokumentacja kompletna, prawomocne pozwolenia na budowę. Termin realizacji projektu: 25.05.2026r. - 30.06.2028r. Problemy: Brak
27	Budowa bulwarów nad Narwią	Miasto Łomża	1 281 373,76	1 089 167,70	EFRR			Cel 4. Zintegrowany rozwój społeczny	
28	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży	Miasto Łomża	9 555 555,56	6 603 432,70	EFRR			Cel 1. Wzrost dostępności komunikacyjnej	Status projektu: Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 12.12.2023r. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet FEPW.03 Zrównoważona mobilność miejska, Działanie FEPW.03.01 Zrównoważona mobilność miejska, Nabór FEPW. 03.01 IP. 01 002/23. Umowa o dofinansowanie nr FEPW.03.01-IP.01-0006/23-01 została podpisana w dniu 4 kwietnia 2024 r. Wartość całkowita zadania: 49 107 310,52 zł. Wartość dofinansowania: 33 935 946,26 zł.

Stan realizacji: Zadanie w trakcie realizacji. 1. Zakup taboru zeroemisyjnego - (4 autobusy elektryczne o długości od 7,5m do 9,5m) – W dniu 28.03.2025 r. zawarto umowę z dostawcą na kwotę 10 012 200,00 zł. Termin realizacji zadania 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. W 2025 r. nie poniesiono kosztów w ramach zadania. 2. Przebudowa warsztatów MPK w łomży do obsługi autobusów zeroemisyjnych. Zakres inwestycji dotyczy przebudowy części 'A' i 'C' oraz budowy części 'B' budynku warsztatu samochodowego – W dniu 19 grudnia 2024 r. podpisano umowę nr WIR.272.2.24.2024 z wykonawcą na kwotę po aneksach 10 147 008,32 zł. W ramach umowy z wykonawcą na 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę: 8 426 852,27 zł. 3. Budowa hali garażowej w MPK jako konstrukcji pod instalację fotowoltaiczną z instalacją fotowoltaiczną – w ramach zadania w dniu 26.01.2026 r. Podpisano umowę nr WIR.272.2.2.2026 z wykonawcą na kwotę 10 565 700,00 zł. Termin realizacji zadania 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 4. Utworzenie Park & Ride – W dniu 21.08.2025 r. podpisano umowę nr WIR.272.2.19.2025 z wykonawcą na kwotę 9 270 000,00 zł brutto/ 7 536 585,37 zł netto (w formule „zaprojektuj i wybuduj”). Termin realizacji zadania 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. W 2025 r. nie poniesiono wydatków w ramach zadania. 5. Utworzenie Strefy Płatnego Parkowania – Planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego: II-IV kwartał 2026r. Zadanie nie wymaga zgłoszeń, ani pozwolenia na budowę. 6. Ustawienie samoobsługowych stacji naprawy rowerów – realizacja zadania nie wymaga zgłoszenia ani pozwolenia na budowę. Planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego: II-IV kwartał 2026r. Dodatkowo w 2025 r. w ramach środków własnych zrealizowano dostawę, montaż i uruchomienie stacji transformatorowej na terenie bazy MPK w Łomży. W dniu 28.03.2025 r. podpisano umowę nr WIR.272.2.8.2025 na kwotę 637 000,00 zł netto z wykonawcą. Termin realizacji inwestycji ustalono na 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, termin zmieniono aneksem do dnia 15.12.2025r. W dniu 05.11.2025 r. podpisano protokół odbioru końcowego zadania. Zadanie opłacono w grudniu 2025 r. Na dzień 31.03.2026 r. w ramach projektu wydatkowano kwotę: 9 043 376,52 zł brutto (dofinansowanie: 6 833 540,75 zł). Termin realizacji projektu: 31.01.2025r. – 25.06.2027r. Problemy: Brak								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

W ramach Instrumentu ZIT gminy z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży na koniec 2025 r. złożyły wnioski o dofinansowanie projektów z dwóch głównych Funduszy Europejskich na lata 2021-2027:

➤ **Fundusze Europejskie dla Podlaskiego:**

- EFS+:
 - Kwota dofinansowania UE: około 19,13 mln zł.
 - Procent alokacji EFS+: stanowi około 98,63% alokacji EFS+ określonej w Strategii ZIT MOF Miasta Łomży
- EFRR:
 - Kwota dofinansowania UE: około 57,98 mln zł.
 - Procent alokacji EFRR: stanowi około 43,81% alokacji EFRR określonej w Strategii ZIT MOF Miasta Łomży.

➤ **Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej:**

- EFRR:
 - Kwota dofinansowania UE: 33 935 946,26 zł.
 - Procent alokacji EFRR: stanowi 100% alokacji EFRR określonej w Strategii ZIT MOF Miasta Łomży.

4.3. Problemy i propozycje działań usprawniających wdrażanie alokacji ZIT

Porozumienie z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie realizacji instrumentu ZIT MOF Miasta Łomży, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021–2027 określa prawa i obowiązki Związku ZIT MOF Miasta Łomży, przede wszystkim obowiązek:

- do końca 2024 r. złożenia do oceny IZ projektów, których wartość dofinansowania UE będzie sięgać minimum 15% alokacji każdego z funduszy (EFRR i EFS+),
- do końca 2025 r. złożenia do oceny IZ projektów, których wartość dofinansowania UE będzie sięgać minimum 50% alokacji każdego z funduszy (EFRR i EFS+),
- do końca 2026 r. złożenia do oceny IZ projektów, których wartość dofinansowania UE będzie sięgać minimum 70% alokacji każdego z funduszy (EFRR i EFS+),
- do końca 2027 r. złożenia do oceny IZ projektów, których wartość dofinansowania UE będzie sięgać minimum 95% alokacji każdego z funduszy (EFRR i EFS+).

Do końca 2024 r. gminy wchodzące w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży złożyły do oceny Instytucji Zarządzającej projekty o łącznej wartości dofinansowania UE stanowiącej ok. 8,5% alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz projekty o łącznej wartości dofinansowania UE stanowiącej ok. 21,9 % alokacji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+). W związku z powyższym, jak również w celu efektywniejszego wdrażania instrumentu ZIT, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca, wezwał w marcu 2025 r. MOF Miasta Łomży do opracowania Planu naprawczego wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Plan naprawczy został opracowany i wdrożony. Do końca 2025 r. gminy wchodzące w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży złożyły do oceny Instytucji Zarządzającej projekty o łącznej wartości dofinansowania UE stanowiącej blisko 50% alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz alokacji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+) co nie wymagało wdrożenia kolejnego planu naprawczego.

4.4. Stopień realizacji wskaźników Strategii ZIT MOF Miasta Łomży

W Strategii ZIT określono wskaźniki produktu i rezultatu projektów ZIT, które są jednocześnie wskaźnikami celów strategicznych. Tabela nr 9 określa listę wskaźników produktu (P) oraz wskaźników rezultatu (R) na poziomie projektów realizowanych w formule ZIT.

Poniżej tabela z listą wskaźników produktu (P) oraz wskaźników rezultatu (R) na poziomie projektów realizowanych w formule ZIT osiągniętych na dzień 31.03.2026 r.

Tabela 9 Lista wskaźników produktu (P) oraz wskaźników rezultatu (R) na poziomie projektów realizowanych w formule ZIT osiągniętych do 31.03.2026 r.

Lp.	Priorytet	Nr Działania	Cel szczegółowy	Tryb naboru (konkurencyjny/niekonkurencyjny)	Nazwa projektu	Beneficjent	Wskaźniki dla MOF	Rodzaj wskaźnika P - produktu R - rezultatu	Wartość do 31.03.2026 r.	Wartość docelowa	Cele/kierunki działań w Strategii terytorialnej, w które wpisują się projekty	Fundusz (EFRR/ERDF)
1	Priorytet 2. Region przyjazdy środowisku	2.3 Zintegrowania terytorialnie efektywność energetyczna	2 (i)	konkurencyjny	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w MOF Miasta Łomży	Miasto Łomża Gmina Piątnica Gmina Łomża	Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej (m2)	P	0	18 242,99		EFRR
							Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (osoby)	P	0	82 091	Cel 2. Poprawa ochrony środowiska i dostosowanie do zmian klimatu	
							Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego (szt.)	P	0	1		
							Roczne zużycie energii pierwotnej (MWh / rok)	R	0	1 180,62		
							Szacowana emisja gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2/rok)	R	0	259,042		
2	Priorytet 2. Region przyjazdy środowisku	2.6 Zintegrowana terytorialnie energia odnawialna	2 (ii)	konkurencyjny	Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w MOF Miasta Łomży	Miasto Łomża Gmina Piątnica Gmina Łomża Gmina Nowogród	Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (szt.)	P	0	29		EFRR
							Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (w tym. energii elektrycznej (MW))	P	0	2,47	Cel 2. Poprawa ochrony środowiska i dostosowanie do zmian klimatu	
							Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (osoby)	P	0	85 994		
							Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego (szt.)	P	0	1		
							Wytworzona energia odnawialna ogółem (w tym: energia elektryczna (MWh / rok)	R	0	1 680		
							Zielona infrastruktura wybudowana lub zmodernizowana w celu przystosowania się do zmian klimatu (ha)	P	0	19,577		
3	Priorytet 2. Region przyjazdy środowisku	2.8 Zintegrowana terytorialnie adaptacja do zmian klimatu	2 (iv)	konkurencyjny	Adaptacja do zmian klimatu terenów w MOF Miasta Łomży	Miasto Łomża Gmina Łomża Gmina Nowogród	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (osoby)	P	0	75 701		EFRR
							Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego (szt.)	P	0	1	Cel 2. Poprawa ochrony środowiska i dostosowanie do zmian klimatu	
							Pojemność obiektów malej retencji (tys. m3)	P	0	32,8815		
							Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed klęskami żywiołowymi związanymi z klimatem (oprócz powodzi lub niekontrolowanych pożarów) (osoby)	R	0	11 050		
4	Priorytet 4.Przestrzeń społeczna wysokiej jakości	4.4 Zintegrowane terytorialnie inwestycje społeczne	4 (iii)	konkurencyjny	Infrastruktura społeczna w MOF Miasta Łomży (Kluby seniora).	Miasto Łomża Gmina Piątnica Gmina Łomża	Ludność objęta projektami w ramach zintegrowanych działań na rzecz włączenia społeczno- gospodarczego społeczności marginalizowanych, gospodarstw	P	0	220	Cel 3. Zintegrowany rozwój społeczny	EFRR

							domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji (osoby)					
5	Priorytet 5. Zrównoważony rozwój terytorialny	5.2. Zintegrowana terytorialnie kultura i turystyka miejska	5 (i)	konkurencyjny	Przebudowa, rozbudowa, remont budynków przeznaczonych do prowadzenia działalności kulturalnej w MOF Miasta Łomży	Miasto Łomża Gmina Piątnica Gmina Nowogród	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (osoby)	P	0	82 311	EFRR	Cel 4. Zintegrowany rozwój społeczny
							Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego (szt.)	P	0	1		
							Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych lokali socjalnych (użytkownicy/rok)	R	0	250		
							Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (osoby)	P	85 581	74 460		
6	Priorytet 5. Zrównoważony rozwój terytorialny	5.2. Zintegrowana terytorialnie kultura i turystyka miejska	5 (i)	konkurencyjny	Budowa bulwarów nad Narwią	Miasto Łomża	Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego (osoby)	P	1	1	EFRR	Cel 4. Zintegrowany rozwój społeczny
							Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem (szt.)	P	1	3		
							Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem (osoby/rok)	R	0	11 851		
							Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (osoby)	P	0	85 994		
7	Priorytet 6. Zrównoważona mobilność miejska	6.2 Zintegrowana terytorialnie mobilność miejska	2 (viii)	konkurencyjny	Rozbudowa sieci tras rowerowych wraz z infrastrukturą	Miasto Łomża	Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego (osoby)	P	0	1	EFRR	Cel 4. Zintegrowany rozwój społeczny
							Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem (szt.)	P	0	1		
							Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem (osoby/rok)	R	0	10 000		
							Długość wybudowanych tras rowerowych (km)	P	0	10		
8	Priorytet 8. Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego	8.2 Zintegrowany terytorialnie rozwój edukacji i kształcenia	4(f)	konkurencyjny	Działania w obszarze edukacji przedszkolnej w MOF Miasta Łomży	Miasto Łomża Gmina Piątnica Gmina Łomża Gmina Nowogród	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (osoby)	P	0	0	EFRR	Cel 1. Wzrost dostępności komunikacyjnej
							Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do dzieci niepełnosprawnych	P	0	0		
							Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej (osoby)	P	0	765		
							Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (osoby)	P	0	85 994		
							Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem (podmioty)	P	0	30	EFS+	Cel 3. Wzrost jakości edukacji
							Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem (osoby)	P	0	125		

4.5. Partycypacja społeczna

W maju 2026 r. raport z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży za 2025 r. został przesłany do Zespołu doradczego partnerów społeczno-gospodarczych, w celu zgłaszania uwag. Zespół doradczy partnerów społeczno-gospodarczych pełniący funkcję ciała opiniującego-doradczego nie zgłosił uwag do przedłożonego raportu, w związku z czym uznaje się raport za zaopiniowany pozytywnie.

5. Podsumowanie

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży stanowi podstawowy dokument koordynujący działania rozwojowe partnerstwa terytorialnego w perspektywie do roku 2030. Rok 2025 był okresem intensywnego aplikowania o środki zewnętrzne oraz realizacji projektów w ramach Strategii ZIT MOF Miasta Łomży. W tym samym czasie wdrażany był plan naprawczy, którego celem było usprawnienie zarządzania projektami oraz zwiększenie efektywności wykorzystania dostępnych funduszy.

Pomimo napotkanych trudności, w szczególności w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej oraz spełnienia wymagań środowiskowych, Partnerstwo konsekwentnie podejmuje działania naprawcze i dostosowawcze, wpisujące się w założenia wdrażanego planu naprawczego. Zidentyfikowane bariery wdrożeniowe umożliwiły opracowanie zestawu rekomendacji ukierunkowanych na zwiększenie efektywności realizacji Strategii oraz usprawnienie procesów zarządczych. Dalsze powodzenie wdrażania Strategii uzależnione będzie od utrzymania ścisłej współpracy pomiędzy partnerami, skutecznej koordynacji działań oraz konsekwentnego wdrażania rozwiązań usprawniających cały proces realizacji przedsięwzięć.

Na początku 2026 r. Partnerstwo przystąpiło do prac związanych z aktualizacją Strategii ZIT MOF Miasta Łomży, w związku ze zmianą Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Spis rysunków

RYSUNEK 1 STRUKTURA ZARZĄDZANIA WDRAŻANIEM STRATEGII ZIT.	4
--	---

Spis tabel

TABELA 1 STRUKTURA CELÓW STRATEGICZNYCH I KIERUNKÓW DZIAŁAŃ.....	7
TABELA 2 LISTA PROJEKTÓW NABÓR KONKRECYJNY/NIEKONKURENCYJNY	7
TABELA 3 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WG CELÓW STRATEGICZNYCH	8
TABELA 4 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WG PROGRAMÓW.....	9
TABELA 5 WYDATKI WG PARTNERÓW	9
TABELA 6 PODZIAŁ ALOKACJI W RAMACH ZWIĄZKU ZIT MOF MIASTA ŁOMŻY	10
TABELA 7 PODZIAŁ ALOKACJI ZWIĄZKU ZIT MOF MIASTA ŁOMŻY W ZAKRESIE CELÓW FINANSOWYCH REALIZACJI STRATEGII ZIT.....	10
TABELA 8 STAN ZAAWANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ STRATEGII ZIT NA DZIEŃ 31.03.2025 R. ORAZ ŹRÓDŁA FINASOWANIA.....	11
TABELA 9 LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU (P) ORAZ WSKAŹNIKÓW REZULTATU (R) NA POZIOMIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W FORMULE ZIT.....	22
